

Abfluss-Mann GbR Abwassertechnik Lautenschlager & Gross

WC – Bad – Gully – Regenabläufe – Pumpenschächte -
Grubentleerung – Fettabscheider – Wurzel-fräsen -
TV-Kanal-Untersuchung / - Ortung – Dichtheitsprüfung nach DIN

TEL: 089 / 40 15 99

Abfluss-Mann GbR

abfluss-mann@t-online.de

Abfluss-Mann GbR Cincinnatistraße 18 81549 München

Cincinnatistraße 18

81549 München

TEL: 089 / 40 15 99

Fax: 089 / 40 90 71 76

www.abfluss-mann.de

Überdruckprüfung Rohr

Methode: EN 1610 LD tr

Ausf. Firma: Abfluss-Mann GbR

Prüfer: Krieglmeyer

Ingenieurbüro:

Bauaufsicht: Herr Lautenschlager

Kunde: Fa. KLS

Bauvorhaben:

Straße:

Ort:

Hal tung:

Schacht oben:

Schacht unten:

Prüfvolumen: 0,1204 m³

Datum: 16.03.2011


Auftrags-Nr.: 3

Prüf-Nr.: 3

München

Von Rev. zum Haus

Grundwasser: 0 m

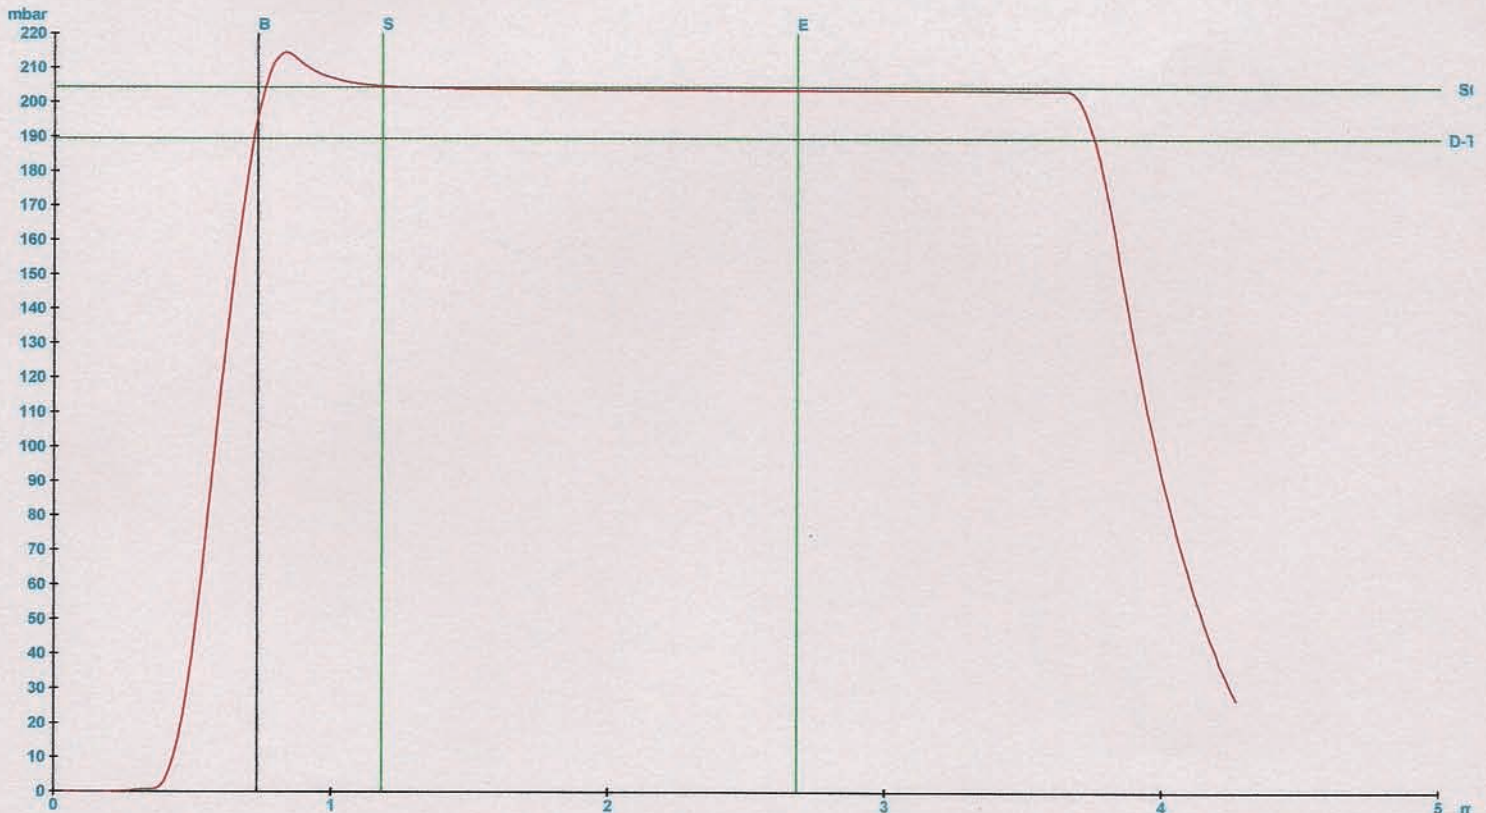

Anmerkung:

Soll-Meßdruck: 204,4 mbar
Anfangsdruck: 204,4 mbar
Enddruck: 203,5 mbar
Druckabfall: 0,9 mbar
Toleranz: 15,0 mbar

Beruhigung: 00:00:27
Meßanfang: 10:23:31
Meßende: 10:25:01
Meßdauer: 00:01:30
Soll-Meßdauer: 00:01:30
Prüfergebnis: **Prüfkriterium erfüllt**
